



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2012.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 1

**ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI
INTERVENTI FINANZIATI**

RIASSUNTO FINANZIARIO REGIONALE SUDDIVISO PER CATEGORIE




RIASSUNTO FINANZIARIO

CATEGORIE	N. FINANZ	IMPORTO	PERCENT.
Finanziamenti dal 2000 ad oggi	520	20.476.468,00	100,0%
Completati	420	15.640.968,00	76,4%
Non completati ed entro i termini dei relativi atti di programma	79	3.750.000,00	18,3%
Completati con saldo oltre i termini previsti dagli atti di programma	4	100.000,00	0,5%
Non completati con ridefinizione termini completamento e/o tipologia struttura per motivazioni validate	15	955.500,00	4,7%
Completati con richiesta di modifica tipologica	2	30.000,00	0,1%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE DI STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE (espressa in euro ed in punti percentuale sul totale)

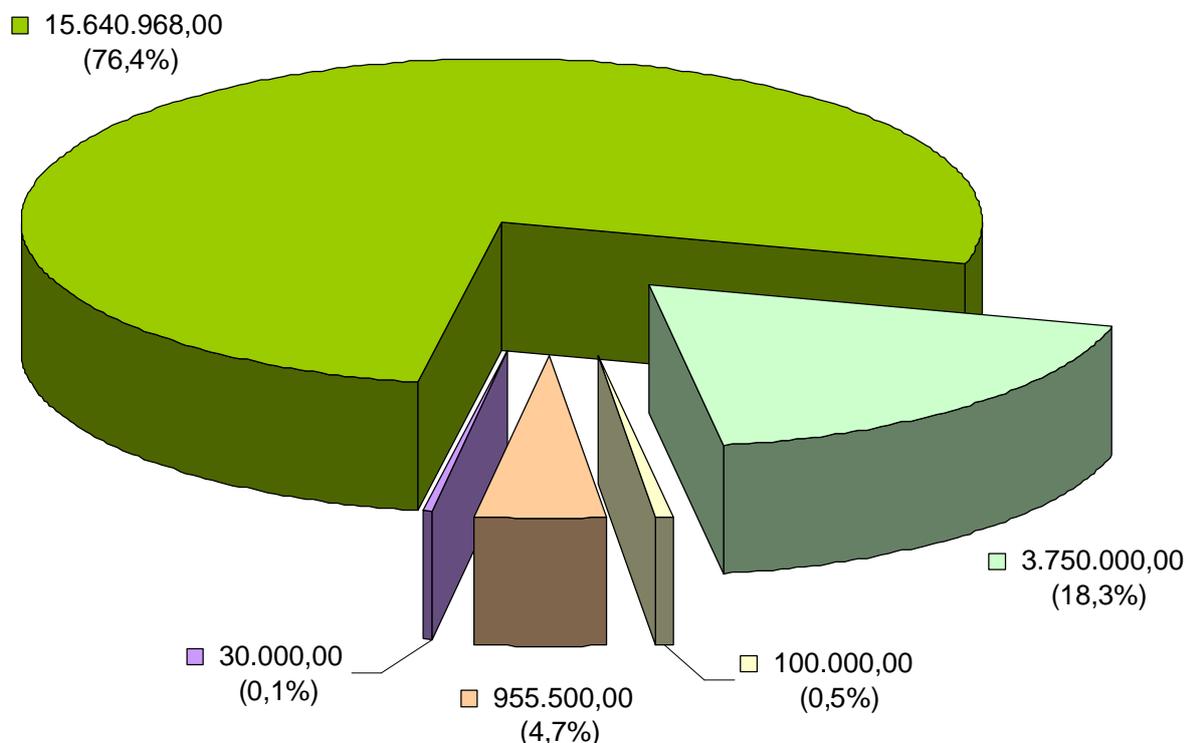

- Completati
- Non completati ed entro i termini dei relativi atti di programma
- Completati con saldo richiesto oltre i termini previsti dagli atti di programma
- Non completati con ridefinizione termini completamento per motivazioni validate
- Completati con richiesta di modifica tipologica



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2012.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 2

**ELENCO INTERVENTI CON
RIDEFINIZIONE DEI TERMINI**



ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
1	PR	Comune	CS	Fidenza	35.000,00	DGR 2246/05	29/12/2005	DGR 2246/05	29/12/2005		31/12/2010	29/12/2010		30/04/2012	Richiesta di saldo tardiva - INTERVENTI GIA' ULTIMATI.
2	PR	Provincia	COC	Calestano	15.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008		14/05/2011	23/05/2011		30/04/2012	Richiesta di saldo tardiva - INTERVENTI GIA' ULTIMATI.
3	PR	Provincia	COC	Terenzo	15.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008		14/05/2011	31/05/2011		30/04/2012	Richiesta di saldo tardiva - INTERVENTI GIA' ULTIMATI.
4	PR	Comune	CS	Borgo Val di Taro	60.000,00	DGR 1661/08	20/10/2008	DD 203/09	29/07/2009	01/06/2011	29/07/2012	19/09/2011	30/04/2012		Richiesta di acconto tardiva. Termini già precedentemente prorogati con DGR 1624/10 e DGR 811/11. Interventi in corso di ultimazione.



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
5	RE	Comune	AA	Guastalla	52.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008	14/06/2009	14/10/2011	14/09/2011	31/05/2012	14/10/2012	Ordinanza prefettizia di sospensione lavori (ai sensi ex art. 10 DPR 252/98) Amm. Comunale in attesa di verifica da parte della Prefettura. Termini già precedentemente prorogati con DGR 811/11.
6	RE	Comunità Montana dell'Appennino Reggiano	CS	Castelnovo ne' Monti	100.000,00	DGR 1661/08	20/10/2008	DD 203/09	29/07/2009	29/01/2011	03/02/2012	16/08/2011	29/08/2012	14/10/2013	Termini già precedentemente prorogati con DGR 1624/10 e DGR 811/11.
7	MO	Comune	CS	Frassinoro	100.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008		31/12/2011	20/10/2011		31/03/2012	Ritardi nella redazione della pratica antisismica; disagi per il cantiere invernale. Struttura in fase di ultimazione. Termini già precedentemente prorogati con con DGR 811 del 13/06/11
8	BO	Comune	CS	Castel del Rio	70.000,00	DGR 1661/08	20/10/2008	DD 203/09	29/07/2009	20/09/2011	29/07/2012	09/09/2011	30/04/2012		Richiesta di acconto tardiva. Interventi in corso di realizzazione.



Regione Emilia Romagna

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protez



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
9	BO	Comune	COC	Calderara	15.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	15/03/2012	31/07/2013	31/12/2013	Ulteriori approfondimenti tecnici hanno individuato sede più adeguata.
10	BO	Comune	CS	Fontanelice	86.500,00	DGR 1661/08	20/10/2008	DD 203/09	29/07/2009	02/04/2011	02/04/2013	15/12/2011	30/04/2012	-	Richiesta di acconto tardiva. Termini già precedentemente prorogati con DGR 1624 del 03/11/10.
11					150.000,00	DD 105/10	02/04/2011	DD 105/10	02/04/2011						
12	BO	Comune	SPA	Sasso Marconi	35.000,00	DGR 1185/06	05/08/2006	DGR 2245/07	27/12/2007	27/12/2008	30/06/2011	17/01/2012	30/06/2012	31/12/2012	La mancata disponibilità di alcuni locali provoca slittamento dei tempi. Termini già precedentemente prorogati con DGR 811 del 13/06/11.
13	FE	Provincia	AA	Codigoro	52.000,00	DGR 1661/04	29/07/2004	DD 5300/06	13/04/2006	30/06/2011	31/12/2012	12/03/2012	31/07/2012	-	Modifica sostanziale del progetto a seguito di valutazioni tecnico-economiche. Termini già precedentemente prorogati con DGR 1624 del 03/11/10.
14	FC	Comune	COC	Forlimpopoli	15.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008	14/06/2009	31/12/2011	17/01/2012	-	30/06/2012	Attesa per l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale.



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
15	RA	Comune	CS	Bagnacavallo	52.000,00	DGR 1185/06	05/08/2006	DD 10459/07	13/08/2007	13/08/2008	13/12/2011	22/12/2011	-	30/06/2012	Termini già precedentemente prorogati con DGR 811 del 13/06/11
16					18.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	DGR 5444/08	14/05/2008	14/06/2009					
17	RN	Provincia	SPA	San Clemente	35.000,00	DGR 1185/06	05/08/2006	DD 10459/07	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	22/03/2011		31/12/2011	Richiesta di saldo tardiva - INTERVENTI GIA' ULTIMATI.
18	RN	Comune	CS	Bellaria Igea Marina	100.000,00	DGR 1661/04	29/07/2004	DD 5300/06	13/04/2006		31/12/2009	12/05/2010	31/12/2011	31/12/2012	Richiesta acconto tardiva, interventi consegnati ed in corso di realizzazione
19					50.000,00	DGR 747/07	29/05/2007	NON IMPEGNATA							
TOTALE €					1.055.500,00										

LEGENDA:



 Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2012.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 3

**ELENCO INTERVENTI COMPLETATI
CON MODIFICA TIPOLOGICA**



ELENCO INTERVENTI COMPLETATI CON MODIFICA TIPOLOGICA

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	NUOVA STRUTTURA	NUOVO ENTE ATTUATORE	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI RICHIESTA SALDO	RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI RICHIESTA SALDO	NOTE
								N°	DEL	N°	DEL				
1	RA	Comune	COC	Conselice	COM	Comune di Bagnacavallo	15.000,00	DGR 1387/03	14/07/2003	DGR 1387/03	14/07/2003	13/07/2007	20/04/2005	30/06/2012	Richiesta di accorpamento dei due finanziamenti in un unico finanziamento per COM MOBILE. Richiesta saldo tardiva. COM GIA' ULTIMATO E UTILIZZATO NELL'AMBITO DELL'ESERCITAZIONE RENO2010.
2	RA	Comune	COC	Sant'Agata sul Santerno			15.000,00	DGR 1387/03	14/07/2003	DGR 1387/03	14/07/2003	13/07/2007			
TOTALE €							30.000,00								

LEGENDA:
